資料９
第１３４回
南極地域観測統合推進本部総会
H21.6.19

砕氷艦「しらせ」就役について

平成21年6月19日（金）

防　衛　省

1　「しらせ」工程線表

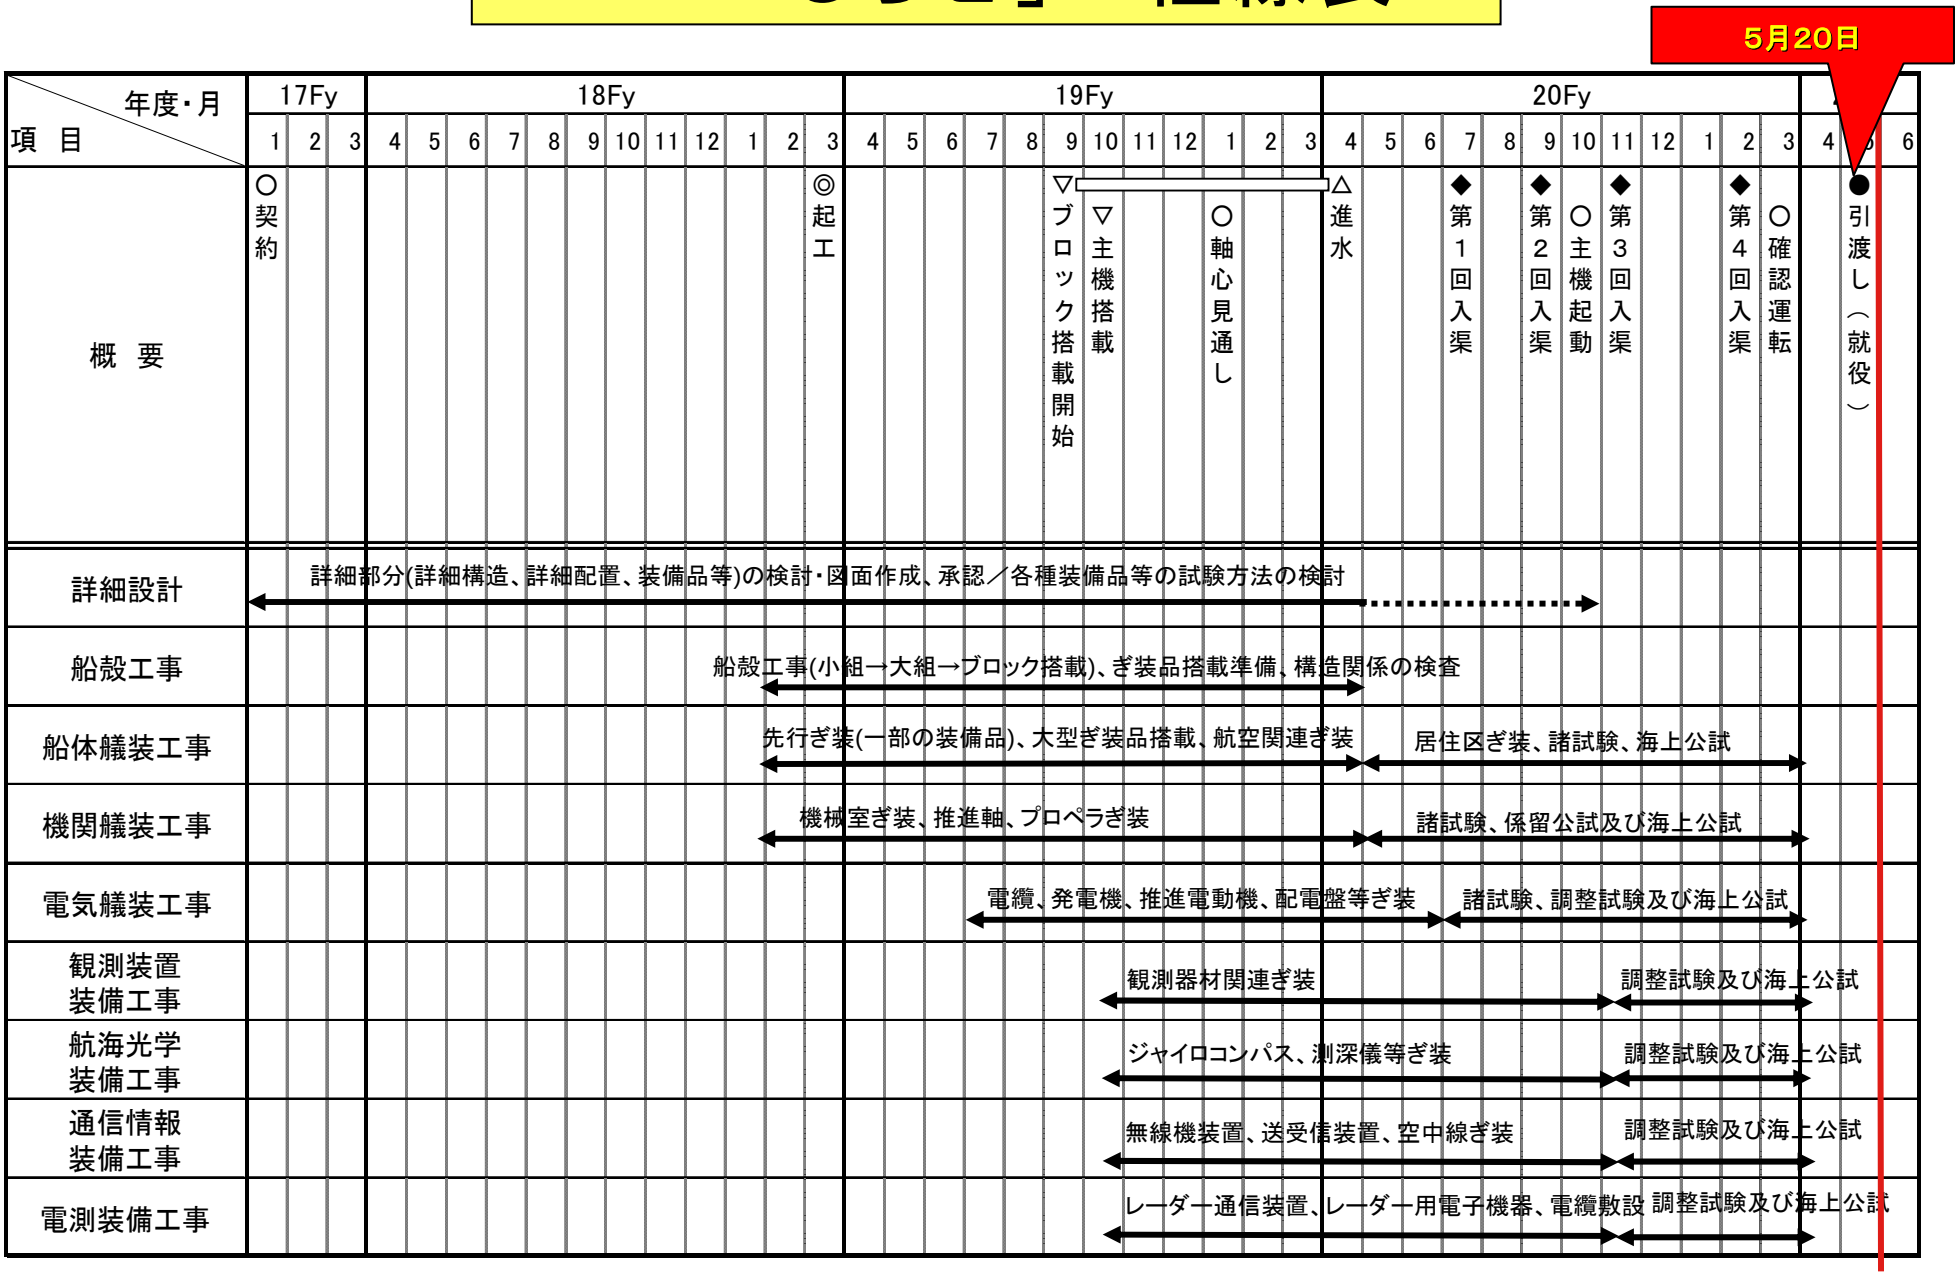
5月20日
年度・月
項　目
17Fy
18Fy
19Fy
20Fy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
概　要
○契約
◎起工
▽ブロック搭載開始
▽主機搭載
○軸心見通し
△進水
◆第1回入渠
◆第2回入渠
○主機起動
◆第3回入渠
◆第4回入渠
○確認運転
●引渡し（就役）
詳細設計
詳細部分(詳細構造、詳細配置、装備品等)の検討・図面作成、承認／各種装備品等の試験方法の検討
船殻工事
船殻工事(小組→大組→ブロック搭載)、ぎ装品搭載準備、構造関係の検査
船体艤装工事
先行ぎ装(一部の装備品)、大型ぎ装品搭載、航空関連ぎ装
居住区ぎ装、諸試験、海上公試
機関艤装工事
機械室ぎ装、推進軸、プロペラぎ装
諸試験、係留公試及び海上公試
電気艤装工事
電纜、発電機、推進電動機、配電盤等ぎ装
諸試験、調整試験及び海上公試
観測装置
装備工事
観測器材関連ぎ装
調整試験及び海上公試
航海光学
装備工事
ジャイロコンパス、測深儀等ぎ装
調整試験及び海上公試
通信情報
装備工事
無線機装置、送受信装置、空中線ぎ装
調整試験及び海上公試
電測装備工事
レーダー通信装置、レーダー用電子機器、電纜敷設
調整試験及び海上公試

２　「しらせ」引渡式

３　砕氷艦「しらせ」艦内写真

艦　橋

士官室

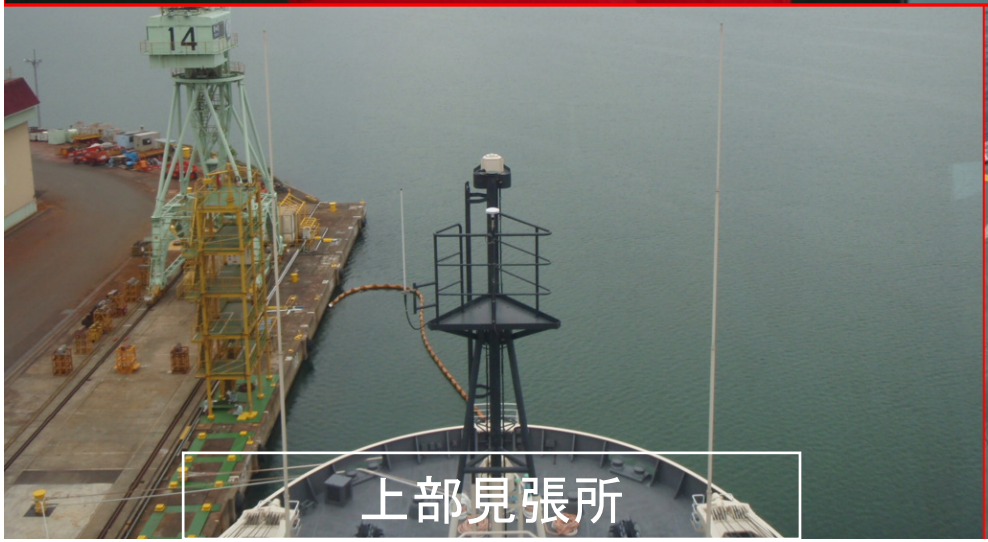

上部見張所

航空機着艦格納確認

３　砕氷艦「しらせ」艦内写真

観測隊長室

観測隊員室

観測隊公室

観測室（第2）

5003
