資料３

■新国立競技場整備事業（第Ⅱ期） 工程表

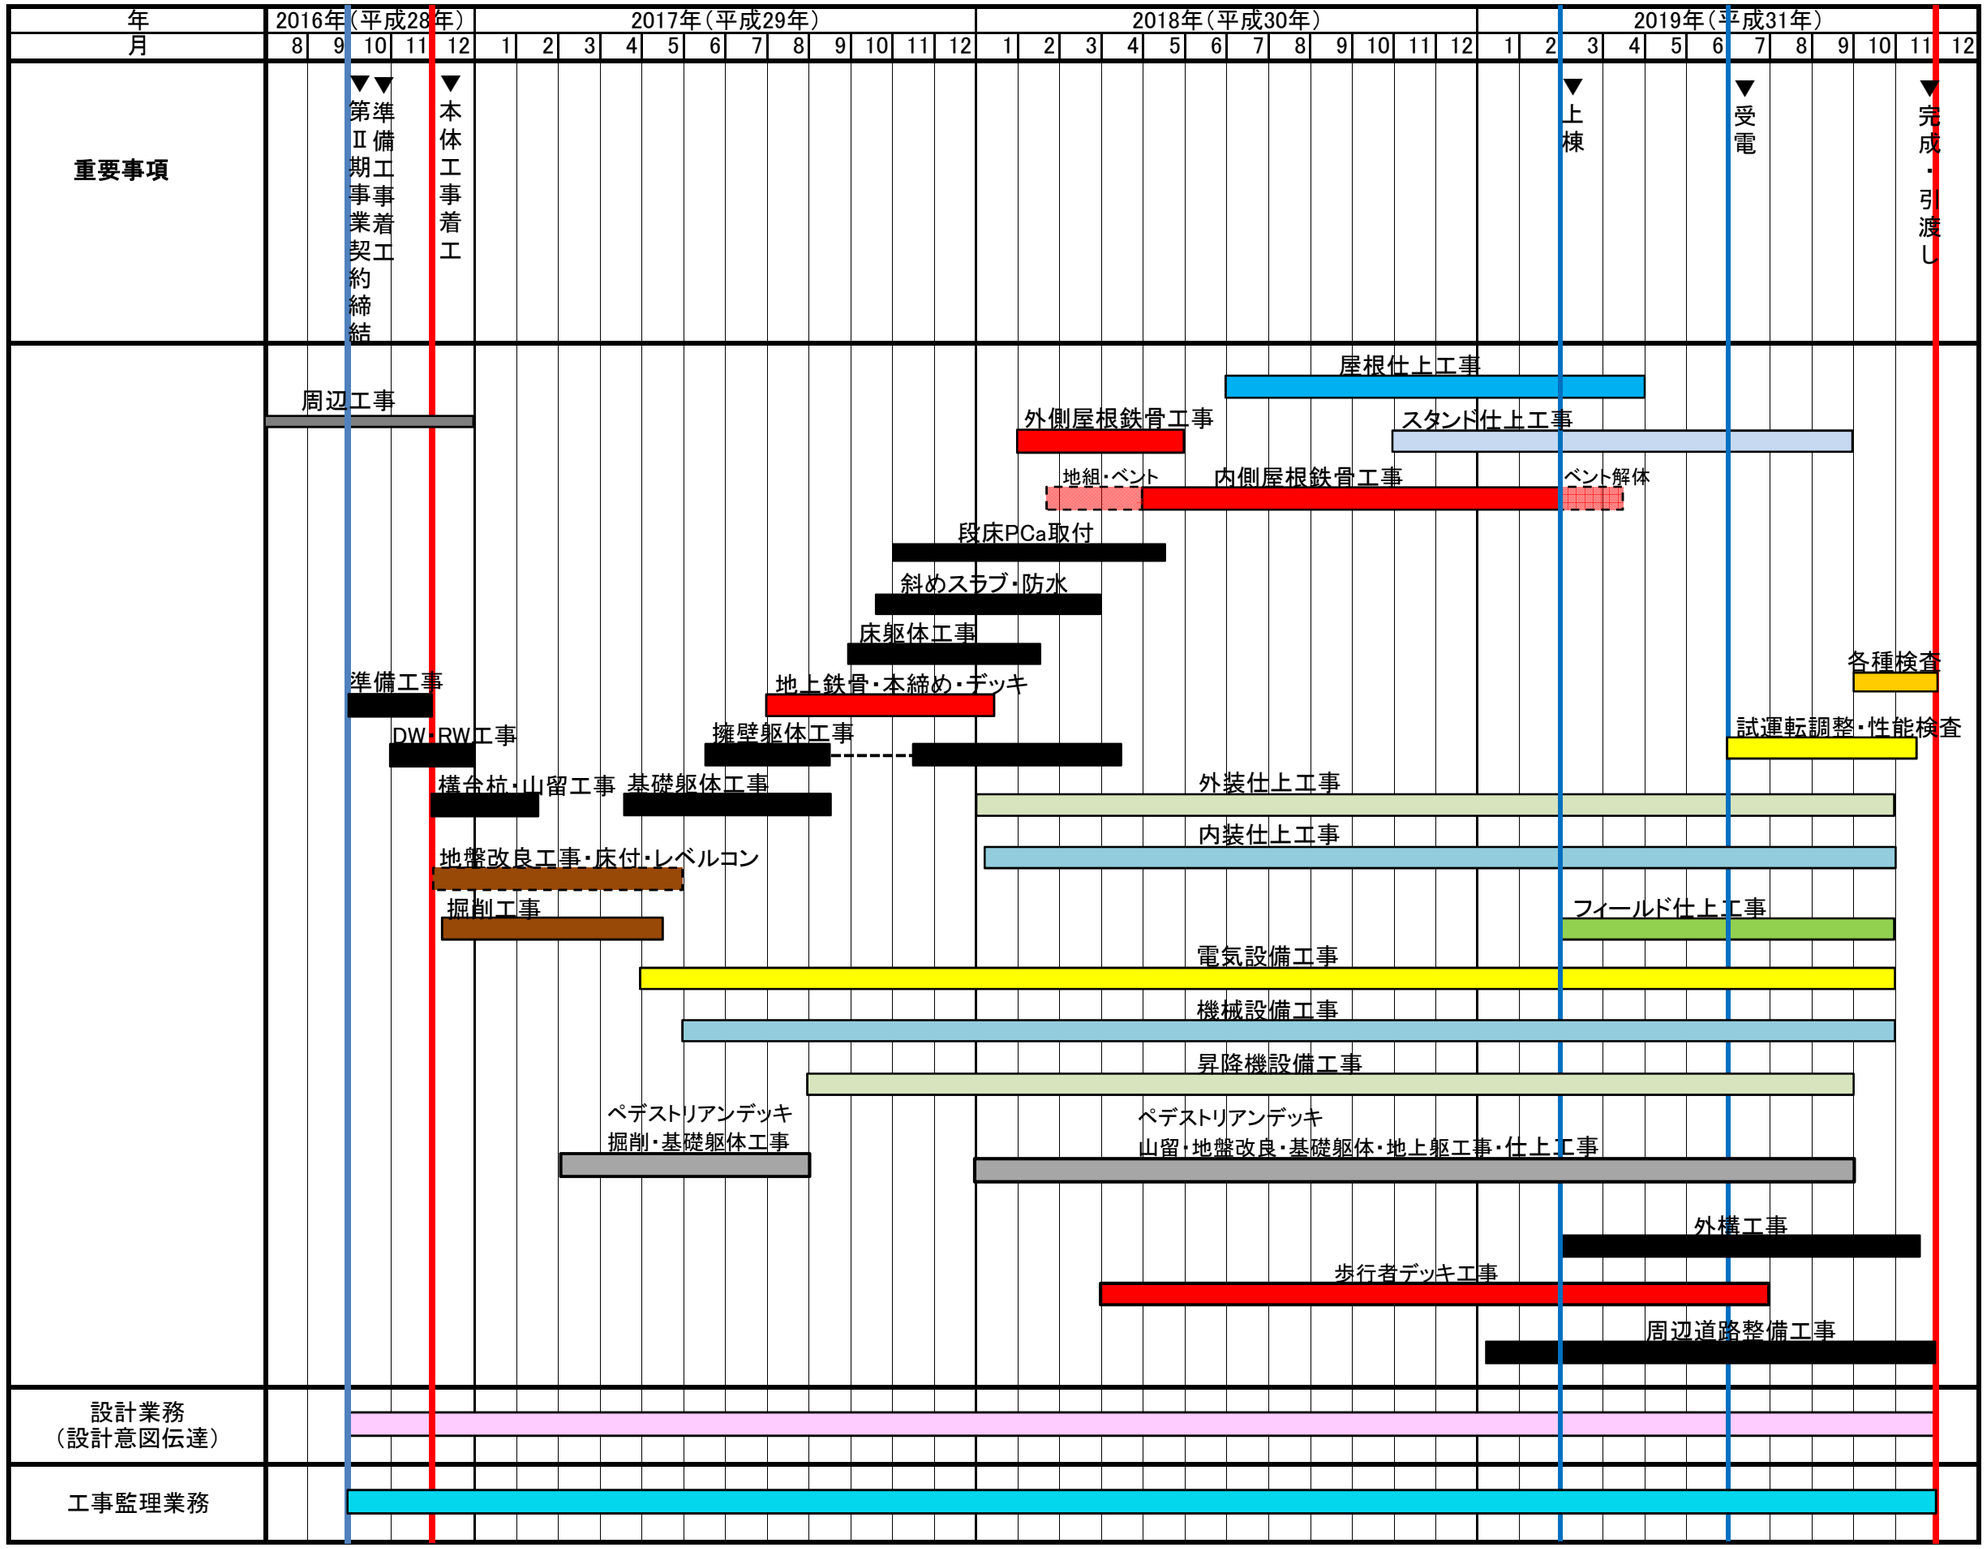

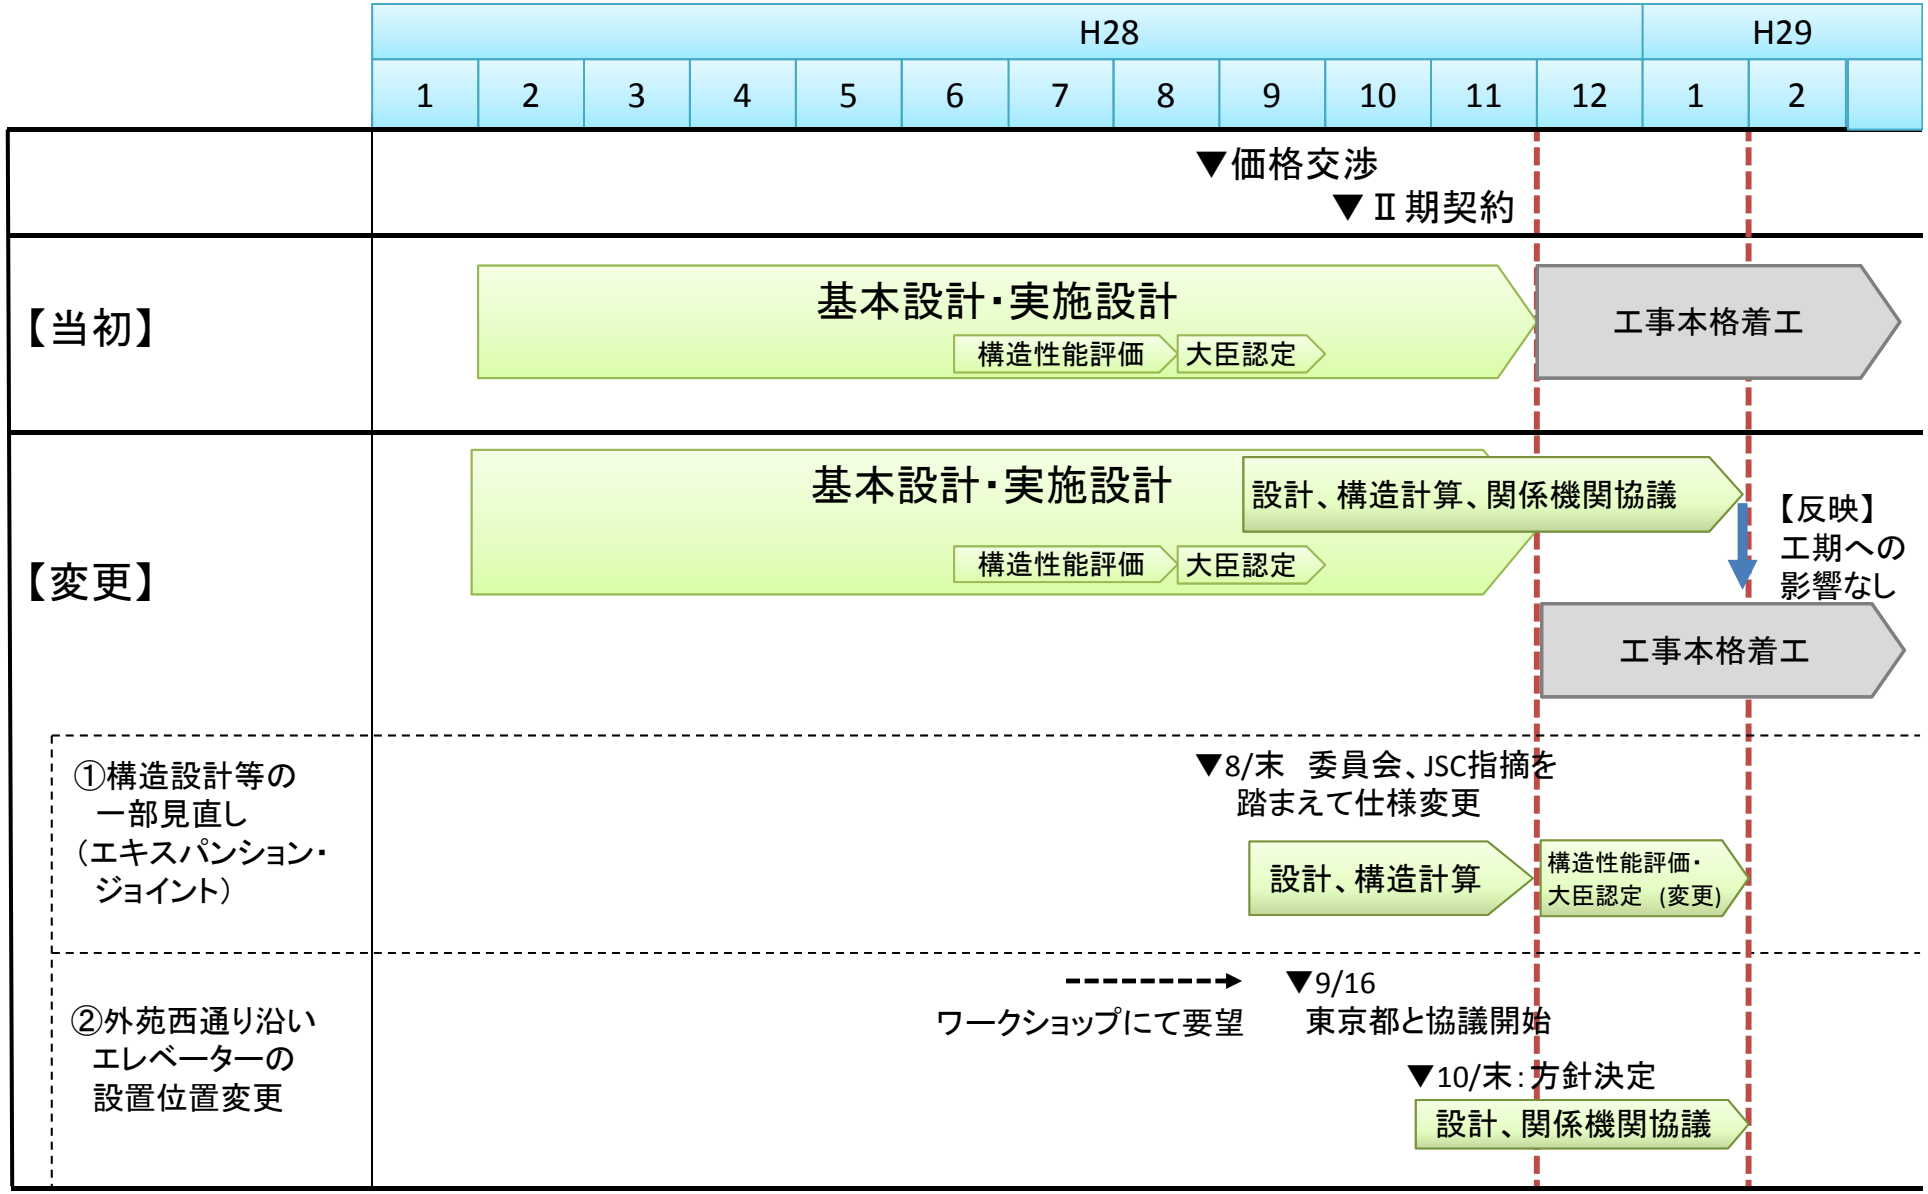
H28
H29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
▼価格交渉
▼Ⅱ期契約
【当初】
基本設計・実施設計
構造性能評価
大臣認定
工事本格着工
【変更】
基本設計・実施設計
設計、構造計算、関係機関協議
構造性能評価
大臣認定
【反映】
工期への
影響なし
工事本格着工
①構造設計等の
一部見直し
（エキスパンション・
ジョイント）
▼8/末　委員会、JSC指摘を
踏まえて仕様変更
設計、構造計算
構造性能評価・
大臣認定（変更）
②外苑西通り沿い
エレベーターの
設置位置変更
ワークショップにて要望
▼9/16
東京都と協議開始
▼10/末：方針決定
設計、関係機関協議
